

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Odabir metodologije

Za razvoj informacijskog sustava **Doma zdravlja** odabrana je **Waterfall metodologija (model vodopada)**. Ova metodologija odabrana je zbog sljedećih razloga:

- **Sekvencijalna struktura razvoja**

Waterfall metodologija omogućuje jasan i logičan slijed faza razvoja - od analize zahtjeva, preko dizajna sustava i implementacije, do testiranja i održavanja. Takav pristup posebno je prikladan za informacijske sustave doma zdravlja, gdje su procesi jasno definirani i regulirani.

- **Stabilni i unaprijed definirani zahtjevi**

Funkcionalni zahtjevi sustava doma zdravlja (zakazivanje termina, evidencija pacijenata, unos nalaza, recepti i uputnice) poznati su unaprijed i ne mijenjaju se često, što Waterfall metodologiju čini prikladnim izborom.

- **Predvidljivost projekta**

Ovaj model omogućuje preciznije planiranje vremena, resursa i odgovornosti unutar projekta, što je važno kod razvoja sustava u zdravstvenom okruženju.

- **Detaljna dokumentacija**

Svaka faza razvoja završava izradom dokumentacije (specifikacija zahtjeva, modeli podataka, dijagrami), što olakšava praćenje napretka i kasnije održavanje sustava.

- **Kontrola kvalitete po fazama**

Prijelaz u sljedeću fazu moguć je tek nakon provjere i odobrenja prethodne faze, čime se smanjuje rizik od grešaka u kasnijim fazama razvoja sustava.


1.1 Sastav ekipe i raspodjela resursa

U nastavku je prikazana struktura projektnog tima i raspodjela odgovornosti tijekom razvoja informacijskog sustava doma zdravlja.

Uloga	Broj članova	Angažman	Odgovornost
Voditelj projekta	1	20% radnog vremena	Planiranje projekta, organizacija rada, koordinacija članova tima, praćenje rokova i komunikacija s naručiteljem
Analitičar sustava	2	60% radnog vremena (svaki)	Prikupljanje i analiza zahtjeva, izrada specifikacije zahtjeva, modeliranje procesa, izrada dijagrama konteksta, aktivnosti i slučajeva korištenja
Programer	1	10% radnog vremena	Razvoj aplikacijskog rješenja prema definiranim zahtjevima i modelima
Dizajner baze podataka	1	20% radnog vremena	Dizajn konceptualnog i logičkog modela podataka, izrada dijagrama razreda, CRC kartica i dijagrama aktivnosti

WBS Zoom Out Cut Delete Outdent Unlink Calendar Save Baseline Scroll To Task Task Usage Paste Notes Clear Baseline Update ViewsClipboardTask							
		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		DOM ZDRAVLJA	40 days	15.12.25. 08:00	06.02.26. 17:00		
2		PRIPREMA I POČETAK F	4 days	15.12.25. 08:00	18.12.25. 17:00		
3		Početak projekta	2 days	15.12.25. 08:00	16.12.25. 17:00		Voditelj projekta
4		Procjena potrebnih resur	2 days	17.12.25. 08:00	18.12.25. 17:00	3	Analitičar sustava
5		ANALIZA POTREBA I ZA	9 days	19.12.25. 08:00	31.12.25. 17:00	4	
6		Izrada prijedloga informa	3 days	29.12.25. 08:00	31.12.25. 17:00	8	Analitičar sustava
7		Istraživanje potreba djel	3 days	19.12.25. 08:00	23.12.25. 17:00		Analitičar sustava
8		Analiza postojećeg načini	3 days	24.12.25. 08:00	26.12.25. 17:00	7	Analitičar sustava
9		DEFINIRANJE ZAHTJEVA	4 days	01.01.26. 08:00	06.01.26. 17:00	6	
10		Definicija zahtjeva korisn	2 days	01.01.26. 08:00	02.01.26. 17:00		Analitičar sustava
11		Izrada dijagrama toka po	2 days	05.01.26. 08:00	06.01.26. 17:00	10	Analitičar sustava
12		DIZAJN SUSTAVA	19 days	07.01.26. 08:00	02.02.26. 17:00	11	
13		Razrada dizajna sustava	6 days	07.01.26. 08:00	14.01.26. 17:00		Programer
14		Planiranje strukture sust	3 days	15.01.26. 08:00	19.01.26. 17:00	13	Programer
15		Definicija modela podatak	4 days	20.01.26. 08:00	23.01.26. 17:00	14	Dizajner baze podataka
16		Definicija načina pohrane	3 days	26.01.26. 08:00	28.01.26. 17:00	15	Programer
17		Utvrdjivanje tehničkih zah	3 days	29.01.26. 08:00	02.02.26. 17:00	16	Programer
18		DOKUMENTIRANJE I ZA	4 days	03.02.26. 08:00	06.02.26. 17:00	17	
19		Dokumentiranje informac	2 days	03.02.26. 08:00	04.02.26. 17:00		Analitičar sustava
20		Završna provjera i preda	2 days	05.02.26. 08:00	06.02.26. 17:00	19	Voditelj projekta

Revidirani plan

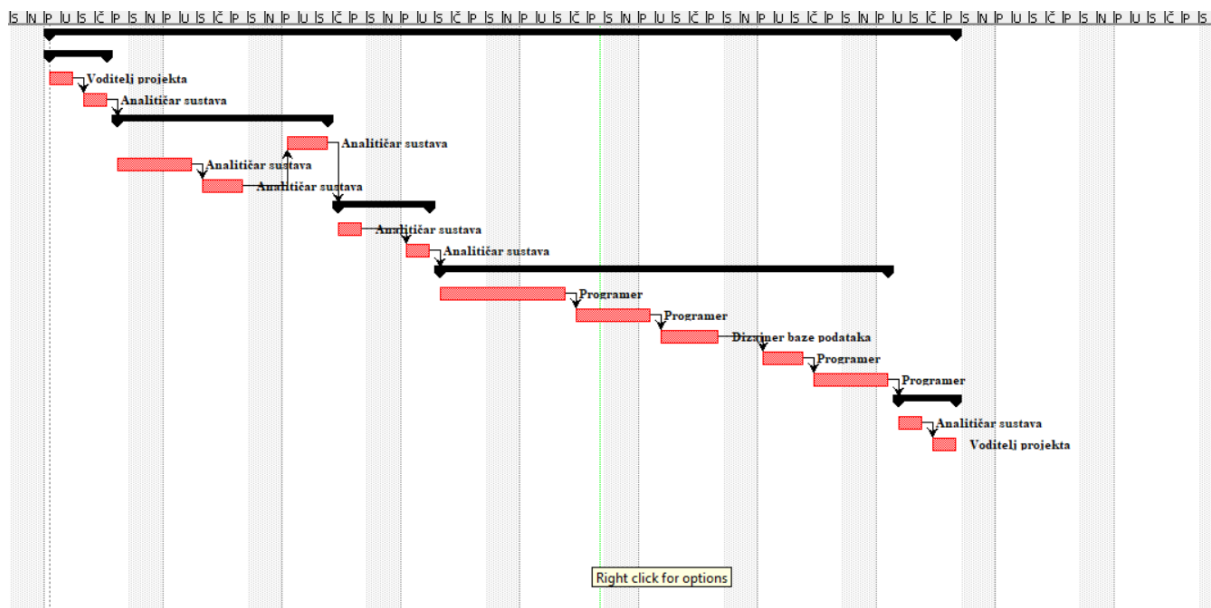

Gantogram
